


# Scenario Tecnico

## Aggiornamento straordinario OGS 2024/2025

### BUEI CIRCOLAZIONE-Regolazione Accesso Rete

Aprile 2025

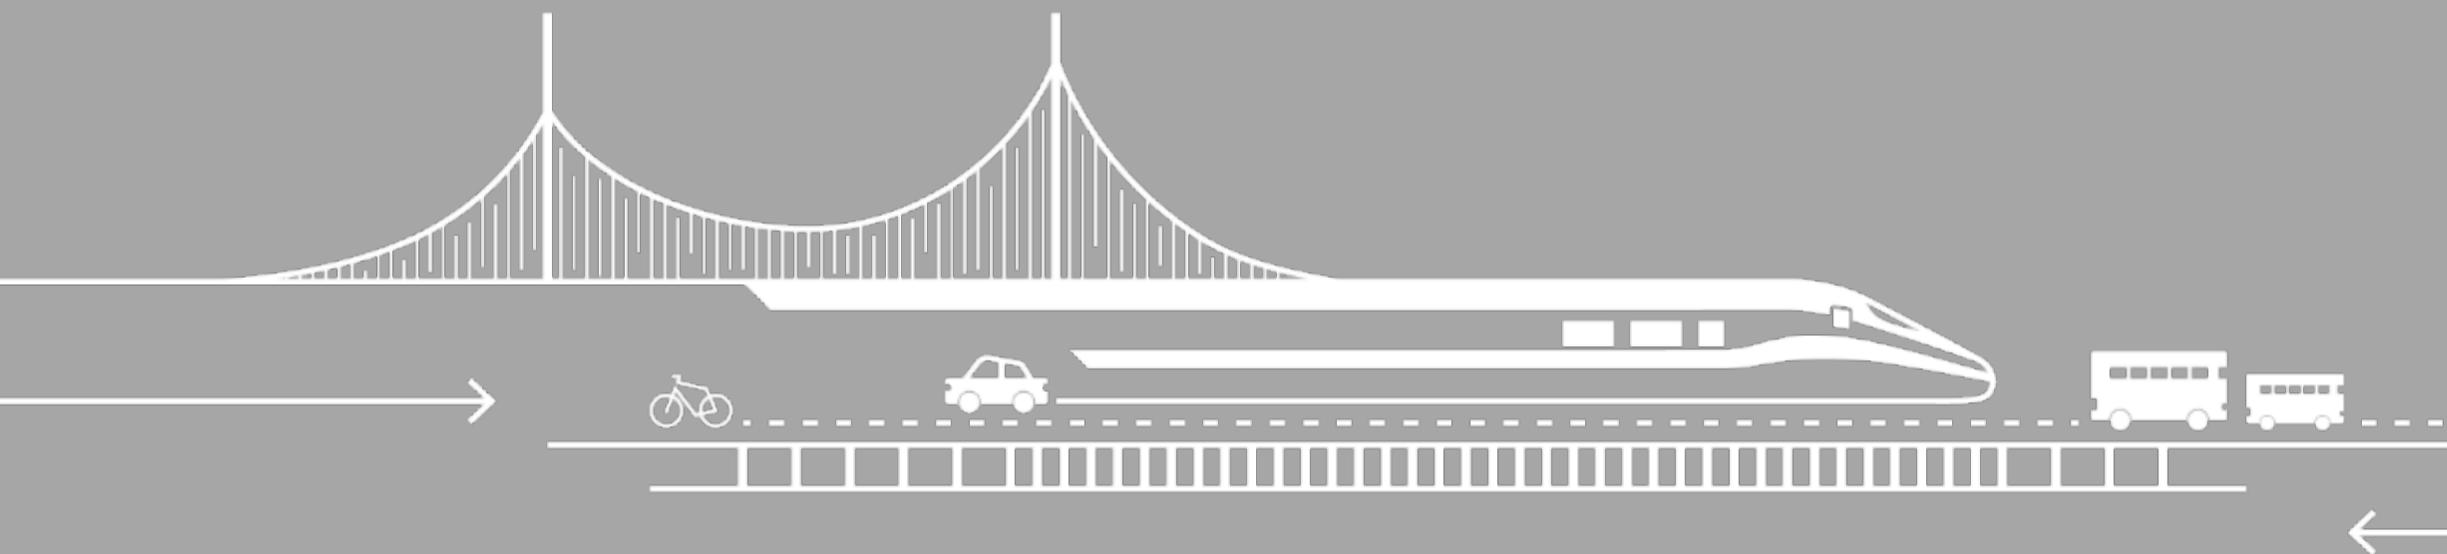

# Orario Generale di Servizio 2024/2025



La rete ferroviaria di FSE si estende per complessivi 474 km, dei quali circa 157 si sviluppano lungo la dorsale sud-est della provincia di Bari, con le linee Mungivacca - Putignano e Bari -Taranto; per i restanti 317 km, la rete si estende sul territorio jonico-salentino con le linee Martina Franca - Lecce, Novoli - Gagliano, Lecce - Gallipoli, Casarano - Gallipoli, Zollino - Gagliano e Maglie - Otranto. • Località servite 74 • Fermate 94 La rete ferroviaria aziendale è interconnessa a quella di R.F.I. nelle stazioni di Bari Centrale, Lecce, Taranto e Francavilla Fontana.



## SERVIZIO FERROVIARIO

### Legenda:

Linea 1	BARI - TARANTO	Km 113
Linea 1 bis	MUNGIVACCA - PUTIGNANO	Km 44
Linea 2	MARTINA FRANCA - LECCE	Km 103
Linea 3	NOVOLI - GAGLIANO	Km 75
Linea 4	CASARANO - GALLIPOLI	Km 23
Linea 5	LECCE - GALLIPOLI	Km 53
Linea 6	ZOLLINO - GAGLIANO	Km 47
Linea 7	MAGLIE - OTRANTO	Km 19

# Linea 1 Bari - Taranto

## Descrizione Linea:

**Lunghezza:** km 112,630

**Capotronco:** Bari FS, Bari SE e Taranto FS

**Diramazione:** Mungivacca, Putignano e Martina F.

**Stazioni:** Bari FS, Bari SE, Mungivacca, Triggiano, Capurso, Noicattaro, Rutigliano, Conversano, Castellana G., Putignano, Noci, Alberobello, Locorotondo, Martina F., Crispiano, Statte, Taranto G. e Taranto FS.

**Fermate:** Grotte di Castellana, Putignano M.L., Martina C.G., e Crispiano S.R.



# Linea 1 Bari - Taranto

**Scenario di Sviluppo:** Upgrade e adeguamento tecnologico e infrastrutturale del tracciato ferroviario Bari - Taranto con adeguamento IS, attrezzaggio SCMT, attrezzaggio TE, HUB 20 stazioni

Tratto Linea	Intervento	Periodo di intervento	Tipologia di indisponibilità
Mungivacca-Noicattaro	a. Adeguamento IS	a. In corso/14 Set. 2025 (riapertura tratta)	a. Linea chiusa all'esercizio temporaneamente
	b. Attrezzaggio SCMT	b. In corso/14 Set. 2025 (riapertura tratta)	b. Linea chiusa all'esercizio temporaneamente
	c. Attrezzaggio TE	c. Da avviare/(*)	c. Interruzioni tecniche/notturne
	d. Completamento fermate Triggiano e Capurso	d. Da avviare/(*)	d. Località fuori servizio commerciale
Noicattaro-Putignano	a. Ripristino TE	a. Da definire	a. Interruzioni tecniche/notturne
	b. Fermata Grotte di Castellana	b. Giu.2024/(*)	b. Località fuori servizio commerciale
Putignano-Martina Franca	a. Adeguamento IS	a. In corso/(*)	a. Interruzioni tecniche/notturne
	b. Attrezzaggio SCMT	b. In corso/(*)	b. Interruzioni tecniche/notturne
Locorotondo-Martina Franca	a) Ricostruzione sottopasso ferroviario SP58	a. Da definire tra Luglio e Agosto**	a. Interruzione continuativa della tratta



\*\* Per la definizione del periodo di interruzione della tratta Locorotondo-Martina seguirà comunicazione ufficiale

\* Gli interventi proseguiranno negli OGS successivi

# Linea 1 Bari - Taranto

**Scenario di Sviluppo:** Upgrade e adeguamento tecnologico e infrastrutturale del tracciato ferroviario Bari - Taranto con adeguamento IS, attrezzaggio SCMT, attrezzaggio TE, HUB 20 stazioni

Tratto Linea	Intervento	Periodo di intervento	Tipologia di indisponibilità
Martina Franca-Taranto	a. Adeguamento IS b. Attrezzaggio SCMT c. Attrezzaggio TE	a. Da avviare/(*) b. Da avviare/(*) c. In corso/Dic. 2025	a. Interruzioni tecniche/notturne b. Interruzioni tecniche/notturne c. Interruzioni tecniche/notturne
Putignano – Martina Franca	Realizzazione HUB Intermodali	15 Giu.2025/29 Giu.2025	Interruzione non continuativa della tratta con possibilità circolazione treni tecnici.
Martina Franca		30 Giu.2025/3 Ago.2025	Limitazioni all'esercizio nella stazione per indisponibilità dei binari di circolazione ad esclusione di un binario.
Putignano		4 Ago.2025/13 Sett. 2025	Limitazioni all'esercizio nella stazione per indisponibilità dei binari di circolazione ad esclusione del secondo binario.
Rutigliano Conversano Castellana Grotte Noci		10 Mar.2025/ 31 Lug.2025 24 Mar.2025/31 mag. 2025 01 Mar.2025/ 31 Lug.2025 01 Dic.2025/11 Gen.2026	Interruzione del primo binario. Interruzione del secondo binario. Interruzione del secondo binario. Interruzione di un binario di circolazione



\* Gli interventi proseguiranno negli OGS successivi

# Linea 1 bis Mungivacca - Putignano

## Descrizione Linea:

**Lunghezza:** km 43,412

**Capotronco:** Mungivacca e Putignano

**Stazioni:** Mungivacca, Valenzano, Adelfia, Casamassima, Sammichele, Turi e Putignano.

**Fermate:** Bari Ceglie-Carbonara, Bari la Fitta, Valenzano-Lamie e Putignano S.P.P.



# Linea 1 bis Mungivacca - Putignano

Scenario di Sviluppo: HUB 20 stazioni

Tratto Linea	Intervento	Periodo di intervento	Tipologia di indisponibilità
Valenzano	Realizzazione HUB Intermodali	Nov.2024/(*)	Limitazioni all'esercizio nella stazione per indisponibilità temporanea dei binari - interruzioni tecniche/notturne



\* Gli interventi proseguiranno negli OGS successivi

# Linea 2 Martina Franca - Lecce

## Descrizione Linea:

**Lunghezza:** km 102,588

**Capotronco:** Martina F. e Lecce

**Diramazione:** Martina F., Novoli e Lecce

**Stazioni:** Martina F., Cisternino Città, Ceglie M., *Francavilla F.*, Manduria, Erchie, San Pancrazio S., Guagnano, Campi S., Novoli e Lecce.

**Fermate:** Pascarosa, Sava e Salice



# Linea 2 Martina Franca - Lecce

**Scenario di Sviluppo:** Upgrade e adeguamento tecnologico e infrastrutturale del tracciato ferroviario Martina F. - Lecce con adeguamento IS, attrezzaggio SCMT, rinnovo armamento, attrezzaggio TE, HUB 20 stazioni

Tratto Linea	Intervento	Periodo di intervento	Tipologia di indisponibilità
Martina Franca-Francavilla F.	a. Adeguamento IS	a. Da avviare/(*)	a. Interruzioni tecniche/notturne
	b. Attrezzaggio SCMT	b. Da avviare/(*)	b. Interruzioni tecniche/notturne
Francavilla F.-Novoli		Giu.2024/(*)	a. Tratta chiusa all'esercizio temporaneamente. Interruzione non continuativa della tratta con possibilità circolazione treni tecnici.
Manduria-Lecce	a. Adeguamento IS	a. In corso/(*)	a. Tratta chiusa all'esercizio temporaneamente fino a Novoli.
	b. Attrezzaggio SCMT	b. In corso/(*)	b. Tratta chiusa all'esercizio temporaneamente fino a Novoli.
Intera Linea	a. Attrezzaggio TE	a. In corso/(*)	a. Francavilla F. - Novoli tratta chiusa all'esercizio. Interruzioni tecniche \notturne per la restante parte di linea.
Ceglie Messapica	Realizzazione HUB Intermodali	14 Giu.2025/17 Ago.2025	Interruzione totale non continuativa della stazione con possibilità circolazione treni tecnici
Manduria		17 Mar.2025/30 Giu.2025	Interruzione del primo e terzo binario



# Linea 3 Novoli – Gagliano del Capo

## Descrizione Linea:

**Lunghezza:** km 74,194

**Capotronco:** Novoli e Gagliano

**Diramazione:** Novoli, Nardò Centrale e Casarano

**Stazioni:** Novoli, Carmiano, Copertino, Nardò Città, Nardò Centrale, Galatone, Seclì, Tuglie, Matino, Casarano, Ugento-Taurisano, Presicce-Acquarica, Salve-Ruggiano e Gagliano

**Fermate:** Monteroni di Lecce, Parabita e Morciano



# Linea 3 Novoli – Gagliano del Capo

**Scenario di Sviluppo:** Upgrade e adeguamento tecnologico e infrastrutturale del tracciato ferroviario Novoli - Gagliano con adeguamento IS, attrezzaggio ERTMS, HUB 20 stazioni

Tratto Linea	Intervento	Periodo di intervento	Tipologia di indisponibilità
Intera Linea	a. Adeguamento IS	a. Da avviare/(*)	a. Interruzioni tecniche/notturne
	b. Attrezzaggio ERTMS	b. Da avviare/(*)	b. Interruzioni tecniche/notturne
Nardò C.le – Gagliano	Attrezzaggio ERTMS	14 Set.2025/13 Dic.2025	Interruzione della tratta Nardò C.le-Gagliano del Capo (escluse).
Casarano	Realizzazione HUB Intermodale	7 Gen.2025/31 Mag.2025	Interruzione del primo binario
		3 Nov.2025/13 Dic.2025	Interruzione della stazione per lavori HUB a Casarano e Gallipoli



\* Gli interventi proseguiranno negli OGS successivi

# Linea 4 Casarano - Gallipoli

## Descrizione Linea:

**Lunghezza:** km 22,003

**Capotronco:** Gallipoli e Casarano

**Diramazione:** Casarano e Gallipoli

**Stazioni:** Casarano, Taviano e Gallipoli

**Fermate:** Melissano, Racale-Alliste, Gallipoli Baia Verde e Gallipoli via Salento



# Linea 4 Casarano - Gallipoli

**Scenario di Sviluppo:** Upgrade e adeguamento tecnologico e infrastrutturale del tracciato ferroviario Casarano - Gallipoli con adeguamento IS, attrezzaggio ERTMS.

Tratto Linea	Intervento	Periodo di intervento	Tipologia di indisponibilità
Intera Linea	a. Adeguamento IS	a. Da avviare/(*)	a. Interruzioni tecniche/notturne
	b. Attrezzaggio ERTMS	b. Da avviare/(*)	b. Interruzioni tecniche/notturne
Casarano Gallipoli	Realizzazione HUB Intermodali	3 Nov.2025/13 Dic. 2025	Interruzione della stazione per lavori HUB a Casarano e Gallipoli Assenza circolazione sulla linea



# Linea 5 Lecce - Gallipoli

## Descrizione Linea:

**Lunghezza:** km 52,961

**Capotronco:** Lecce e Gallipoli

**Diramazione:** Zollino e Nardò Centrale

**Stazioni:** S. Cesario, Galugnano, Zollino, Galatina, Nardò Centrale, Sannicola e Gallipoli

**Fermate:** S. Donato di Lecce, Sternatia, Soletto, Alezio, Gallipoli via Agrigento



# Linea 5 Lecce - Gallipoli

**Scenario di Sviluppo:** Upgrade e adeguamento tecnologico e infrastrutturale del tracciato ferroviario Lecce - Gallipoli con adeguamento IS, attrezzaggio ERTMS, attrezzaggio TE, HUB 20 stazioni

Tratto Linea	Intervento	Periodo di intervento	Tipologia di indisponibilità
Lecce-Zollino	a. Attrezzaggio TE	a. In corso/(*)	a. Interruzioni tecniche/notturne
Intera Linea	a. Adeguamento IS	a. In corso/(*)	a. Interruzioni tecniche notturne
	b. Attrezzaggio ERTMS	b. In corso/(*)	b. Interruzioni tecniche notturne
Zollino-Gallipoli	a. Attrezzaggio ERTMS	a. 28 Apr.2025/14 Giu.2025	a. Interruzione della circolazione sull'intera tratta
Gallipoli	Realizzazione HUB Intermodale	17 Apr.2025/11 Mag.2025	Interruzione totale della stazione
		3 Nov.2025/13 Dic. 2025	Interruzione della stazione per lavori HUB a Casarano e Gallipoli



\* Gli interventi proseguiranno negli OGS successivi

# Linea 6 Zollino – Gagliano del Capo

## Descrizione Linea:

**Lunghezza:** km 46,502

**Capotronco:** Zollino e Gagliano

**Diramazione:** Maglie

**Stazioni:** Zollino, Corigliano d'Otranto, Maglie, Muro Leccese, Poggiardo, Andrano-Castiglione, Tricase e Gagliano

**Fermate:** Melpignano, Sanarica, Spongano, Miggiano, Tiggiano e Alessano



# Linea 6 Zollino – Gagliano del Capo

**Scenario di Sviluppo:** Upgrade e adeguamento tecnologico e infrastrutturale del tracciato ferroviario Zollino - Gagliano con adeguamento IS, adeguamento IS, attrezzaggio ERTMS, attrezzaggio TE, HUB 20 stazioni

Tratto Linea	Intervento	Periodo di intervento	Tipologia di indisponibilità
Intera Linea	a. Adeguamento IS	a. Da avviare/(*)	a. Interruzioni tecniche/notturne
	b. Attrezzaggio ERTMS	b. Da avviare/(*)	b. Interruzioni tecniche/notturne
	c. Attrezzaggio TE	c. In corso/(*)	c. Interruzioni tecniche/notturne
Maglie-Gagliano	a. Attrezzaggio ERTMS	a. 15 Giu.2025/13 Set.2025	a. Interruzione della circolazione sull'intera tratta
Maglie	Realizzazione HUB intermodale	15 Giu.2025/13 Sett.2025	Interruzione totale della stazione per tutte le domeniche ad esclusione di domenica 24 Agosto 2025



\* Gli interventi proseguiranno negli OGS successivi

# Linea 7 Maglie - Otranto

## Descrizione Linea:

**Lunghezza:** km 18,271

**Capotronco:** Maglie e Otranto

**Stazioni:** Maglie, Bagnolo e Otranto

**Fermate:** Cannole e Giurdignano



# Linea 7 Maglie - Otranto

**Scenario di Sviluppo:** Upgrade e adeguamento tecnologico e infrastrutturale del tracciato ferroviario Maglie - Otranto con adeguamento IS, attrezzaggio ERTMS, attrezzaggio TE, HUB 20 stazioni

Tratto Linea	Intervento	Periodo di intervento	Tipologia di indisponibilità
Intera Linea	a. Adeguamento IS	a. Da avviare/(*)	a. Interruzioni tecniche/notturne
	b. Attrezzaggio ERTMS	b. Da avviare/(*)	b. Interruzioni tecniche/notturne
	c. Attrezzaggio TE	c. In corso/(*)	c. Interruzioni tecniche/notturne
Otranto	Realizzazione HUB Intermodale	15 Giu.2025/13 Sett.2025	Interruzione della stazione di Otranto (per lavori HUB a Maglie tutte le domeniche eccetto il 24/08)
		14 Set.2025/13 Dic.2025	Interruzione della stazione Assenza circolazione sulla linea



\* Gli interventi proseguiranno negli OGS successivi

# FOCUS HUB STAZIONI

Stazioni	Inizio lavori	Fine lavori\attivazione	Disponibilità residua
Noicattaro	Novembre 2024	Giugno 2026\Ottobre 2026	2 binari di circolazione per l'intera durata dei lavori ad eccezione di eventuali richieste. Località fuori servizio fino al 13 settembre 2025
Rutigliano	Marzo 2025	Giugno 2026\Ottobre 2026	2 binari di circolazione per l'intera durata dei lavori ad eccezione di eventuali richieste. Interruzione del primo binario dal 10 marzo 2025 al 31 luglio 2025
Conversano	Marzo 2025	Giugno 2026\Ottobre 2026	2 binari di circolazione per l'intera durata dei lavori ad eccezione di eventuali richieste. Interruzione del secondo binario dal 24 marzo 2025 al 31 maggio 2025
Castellana Grotte	Dicembre 2024	Giugno 2026\Ottobre 2026	2 binari di circolazione per l'intera durata dei lavori ad eccezione di eventuali richieste. Interruzione del secondo binario dal 01 marzo 2025 al 31 luglio 2025
Putignano	Da avviare	Giugno 2026\Ottobre 2026	2 binari di circolazione per l'intera durata dei lavori ad eccezione di eventuali richieste con 3 binari di scalo per ricovero rotabili termici N.B. Ricovero di 5 rotabili con un massimo di 2 rotabili elettrici su binari di circolazione Interruzione parziale della stazione con disponibilità del solo secondo binario dal 4 agosto 2025 al 13 settembre 2025
Noci	Marzo 2025	Giugno 2026\Ottobre 2026	2 binari di circolazione per l'intera durata dei lavori ad eccezione di eventuali richieste (1^fase) 1 binario disponibile dal 01 dicembre 2025 al 11 gennaio 2026 Interruzione della stazione dal 15 giugno 2025 al 29 giugno 2025
Alberobello	Febbraio 2025	Giugno 2026\Ottobre 2026	2 binari di circolazione per l'intera durata dei lavori ad eccezione di eventuali richieste Interruzione della stazione dal 15 giugno 2025 al 29 giugno 2025
Locorotondo	Marzo 2025	Giugno 2026\Ottobre 2026	2 binari di circolazione per l'intera durata dei lavori ad eccezione di eventuali richieste Interruzione della stazione dal 15 giugno 2025 al 29 giugno 2025
Martina Franca	Marzo 2025	Giugno 2026\Ottobre 2026	2 binari di circolazione per l'intera durata dei lavori ad eccezione di eventuali richieste con 2 binari di scalo per ricovero rotabili termici N.B. Ricovero di 5 rotabili con un massimo di 2 rotabili elettrici su binari di circolazione Interruzione parziale della stazione con disponibilità di un solo binario dal 30 giugno 2025 al 3 agosto 2025.
Crispiano	Luglio 2024	Giugno 2026\Ottobre 2026	2 binari di circolazione per l'intera durata dei lavori ad eccezione di eventuali richieste
Valenzano	Novembre 2024	Giugno 2026\Ottobre 2026	2 binari di circolazione per l'intera durata dei lavori ad eccezione di eventuali richieste
Ceglie Messapica	Aprile 2025	Giugno 2026\Ottobre 2026	2 binari di circolazione per l'intera durata dei lavori ad eccezione di eventuali richieste. Interruzione della stazione dal 14 giugno 2025 al 17 agosto 2025
Manduria	Marzo 2025	Giugno 2026\Ottobre 2026	2 binari di circolazione per l'intera durata dei lavori ad eccezione di eventuali richieste. Interruzione del primo e terzo binario dal 17 marzo 2025 al 30 giugno 2025
Novoli	Da avviare	Giugno 2026\Ottobre 2026	1 binario di transito (3°) – 2 binari tronchi (1° e 2°) ad eccezione di eventuali richieste

# FOCUS HUB STAZIONI

Stazioni	Inizio lavori	Fine lavori\attivazione	Disponibilità residua
Casarano	Dicembre 2024	Giugno 2026\Ottobre 2026	2 binari di circolazione per l'intera durata dei lavori ad eccezione di eventuali richieste. Interruzione del primo binario dal 07 gennaio 2025 al 31 maggio 2025 Interruzione di stazione dal 3 novembre 2025 al 13 dicembre 2025
Zollino	Febbraio 2025	Giugno 2026\Ottobre 2026	1 binario di transito (3°) – 2 binari tronchi (1° e 2°) per l'intera durata dei lavori ad eccezione di eventuali richieste
Gallipoli	Novembre 2024	Giugno 2026\Ottobre 2026	3 binari tronchi (1° e 2°) – 2 binari di scalo per ricovero Interruzione della stazione dal 17 aprile 2025 al 11 maggio 2025 Interruzione di stazione dal 3 novembre 2025 al 13 dicembre 2025
Maglie	Da avviare	Giugno 2026\Ottobre 2026	1 binario di transito (3°) – 2 binari tronchi (1° e 2°) per l'intera durata dei lavori ad eccezione di eventuali richieste. Interruzione di stazione durante le domeniche dal 15 giugno 2025 al 13 settembre 2025 (ad eccezione di domenica 24 agosto 2025)
Tricase	Da avviare	Giugno 2026\Ottobre 2026	2 binari di circolazione per l'intera durata dei lavori Possibilità di interruzione dal 15 giugno 2025 al 13 settembre 2025 data l'assenza di circolazione
Otranto	Marzo 2025	Giugno 2026\Ottobre 2026	Interruzione della stazione nelle domeniche dal 15 giugno 2025 al 13 settembre 2025 (ad eccezione di domenica 24 agosto 2025) in relazione alla interruzione di Maglie Interruzione della stazione dal 14 settembre 2025 al 13 dicembre 2025.
